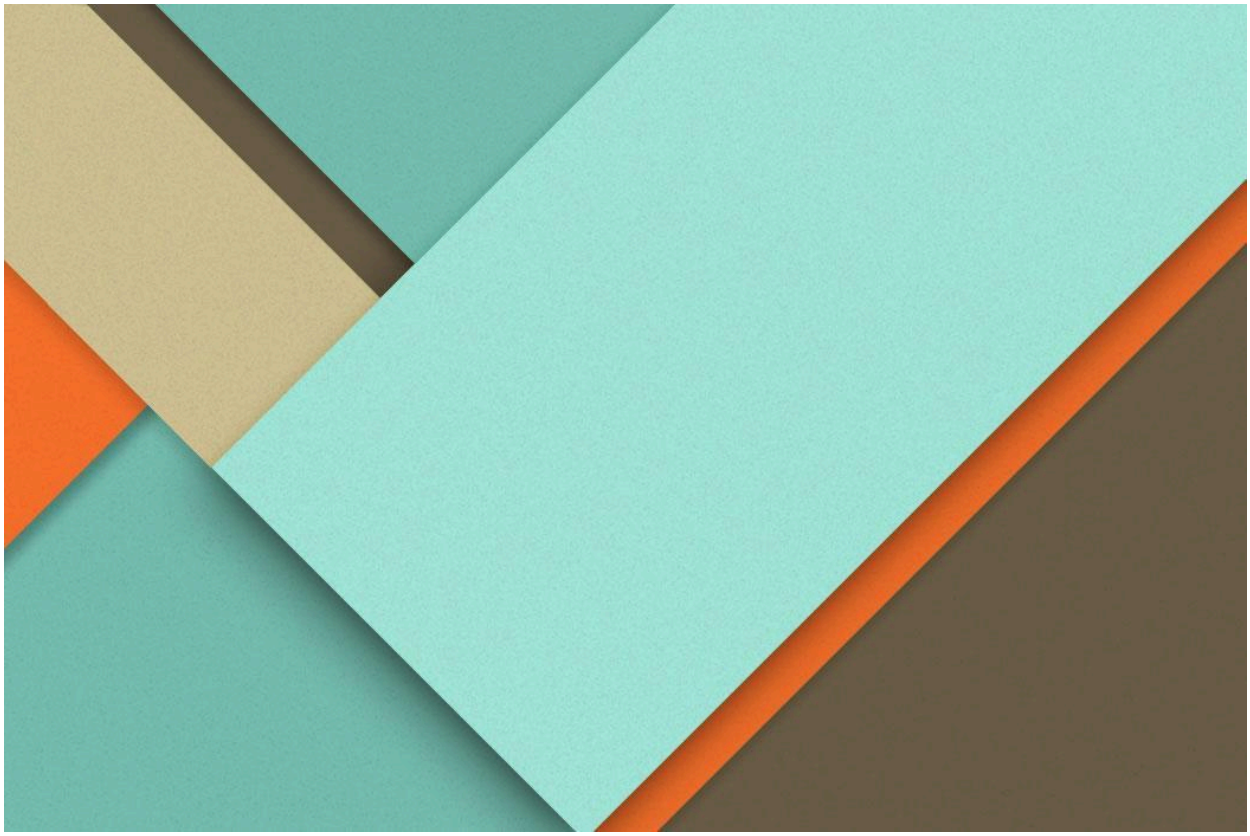


Xtreme Fitness

23/08/2026


— Jeg bekræfter hermed, at jeg selvstændigt og uden uretmæssig hjælp har udviklet det afleverede eksamensprojekt i overensstemmelse med gældende regler for prøven.

Tim Gudiksen

Medieskolerne

Webudvikler WebH125-2

Prøveeksamensopgave



Vurdering af egen indsats

Jeg nåede næsten i mål med projektet. Responsiveness og 404-side nåede jeg ikke. Dette er primært forårsaget af dårlig planlægning. Fredag var jeg væk hele dagen pga en begravelse, og det gjorde at jeg, særligt mandag, havde en masse at gennemføre uden mulighed for meget pause i det. Det endte fint nok, men særligt på backoffice blev koden ikke struktureret så godt, eller opbygget i komponenter, da selvom det gør det hele mere overskueligt og nemmere at arbejde med, så vurderede jeg at jeg ikke havde tiden til at oprette det ekstra struktur og ekstra filer der skulle til for at gøre det muligt. BackofficeEdit siden er den der fik det værste af det.

Min største udfordring i projektet var login-funktionaliteten, ville gerne sørge for det var struktureret efter best-practice, så mappestruktur og lignende gav mening, men havde svært ved at finde frem til hvad der ville gøres i en rigtig production.


Så mere korrekt tror jeg at jeg vil sige at min største udfordring generelt var strukturering af projektet, samt oprettelsen af issues. Min første dags issues, inden jeg reelt påbegyndte projektet, gav ikke meget god mening. Mange af issues var repetitive grundet hjemmesidens genbrugelige komponenter.

Det er også her jeg fagligt har lavet mest fremskridt, jeg tror til mit næste projekt at jeg har en meget bedre ide om hvordan jeg skal oprette issues, så projektstyringen generelt bliver mere effektiv, og i det store billede spare tid på projektet.

Tidsplan og proces

Generelle plan

Min umiddelbare plan er at påbegynde projektet med Sitewide-komponenterne, og derefter følge op med undersiderne, og derefter slutte af med forsiden. Dette er fordi forsiden i stor del indeholder komponenter som undersiderne benytter sig af, og jeg på den måde kan dele opgaverne ud i mindre bidder, og færdiggøre en underside af gangen, hvor jeg så afsluttende kan samle komponenterne på forsiden, da de opbygges med henblik på genanvendelighed.

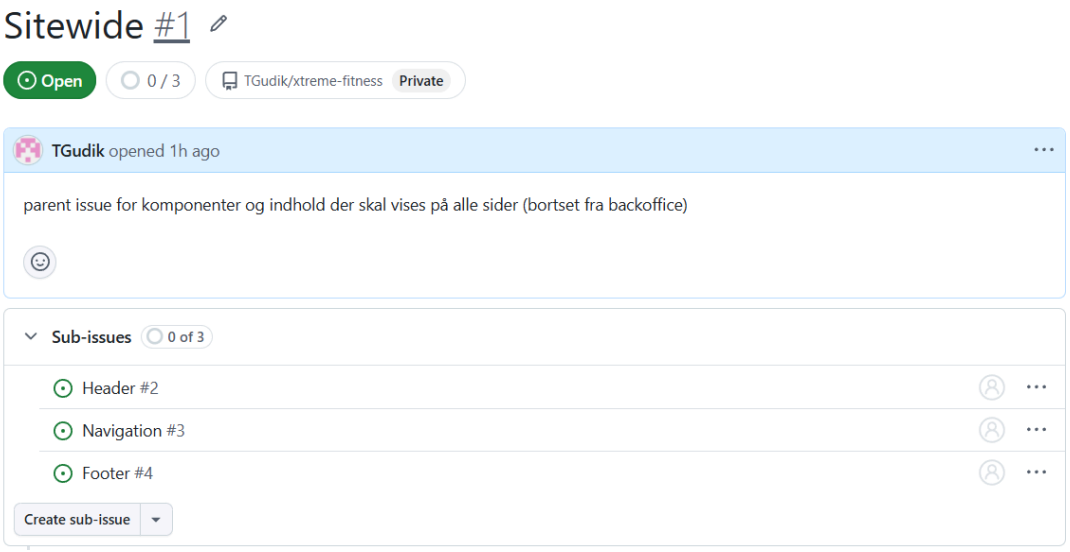

Issue'et 'Sitewide' og subissues udgør de komponenter der vises på hele siden for brugeren, så de vises ikke nødvendigvis på backoffice.

Estimeret tid: 2 Timer

Blog Page #14

Open 0 / 2 TGudik/xtreme-fitness Private

TGudik opened 1h ago

Indeholder blogposts fra Api

Sub-issues 0 of 2

- Blogposts (blogpage) #15
- Blogdetails page #31

Create sub-issue

Henter blogposts og lader bruger gå til blogdetails gennem en knap, som viser detaljer om enkelte posts

Estimeret tid: 2-3 timer

About Page #16

Open 0 / 3 TGudik/xtreme-fitness Private

TGudik opened 1h ago

No description provided.


Sub-issues 0 of 3

- About #17
- contact (about) #18
- news #19

Create sub-issue


Side med intro-section, formular og seneste blogindlæg

Estimeret tid: 3 timer

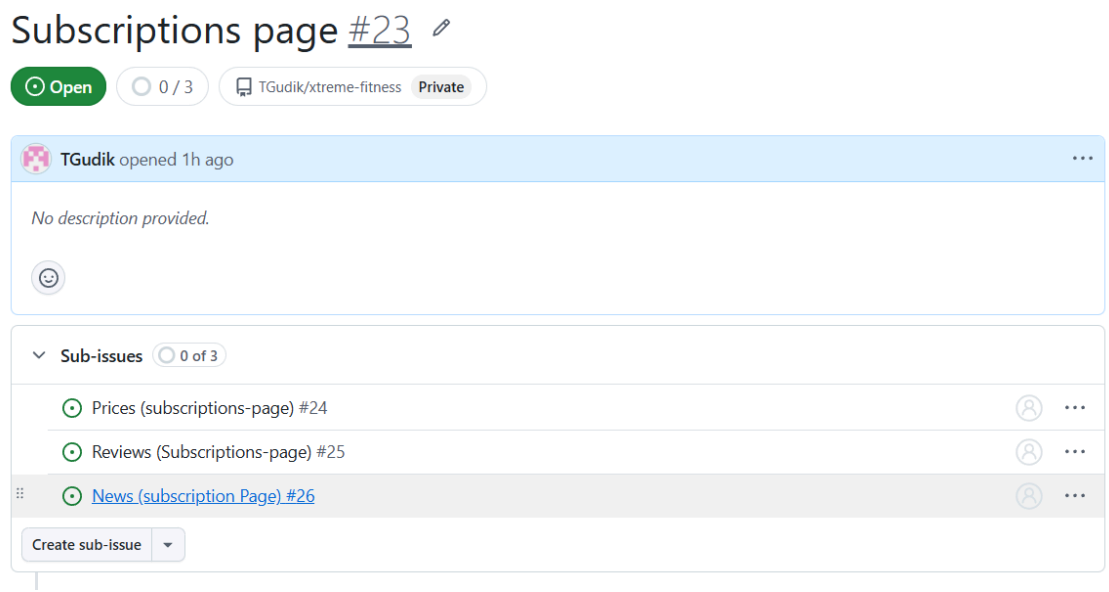


Subscriptions page indeholder cards med medlemsskaber, reviews og seneste blog-indlæg, reviews og blog genbruges fra andre sider

Estimeret tid: 1-2 timer

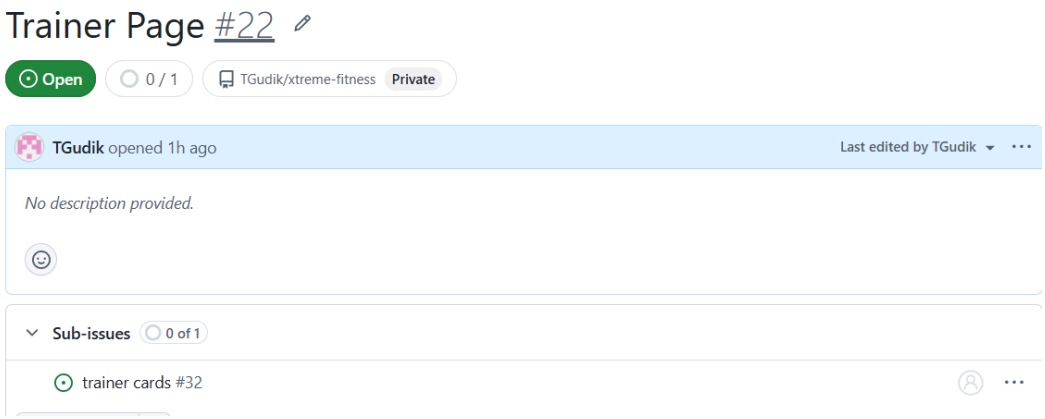


trænersiden indeholder cards med link til træners SoMe's

Estimeret tid: 1 time

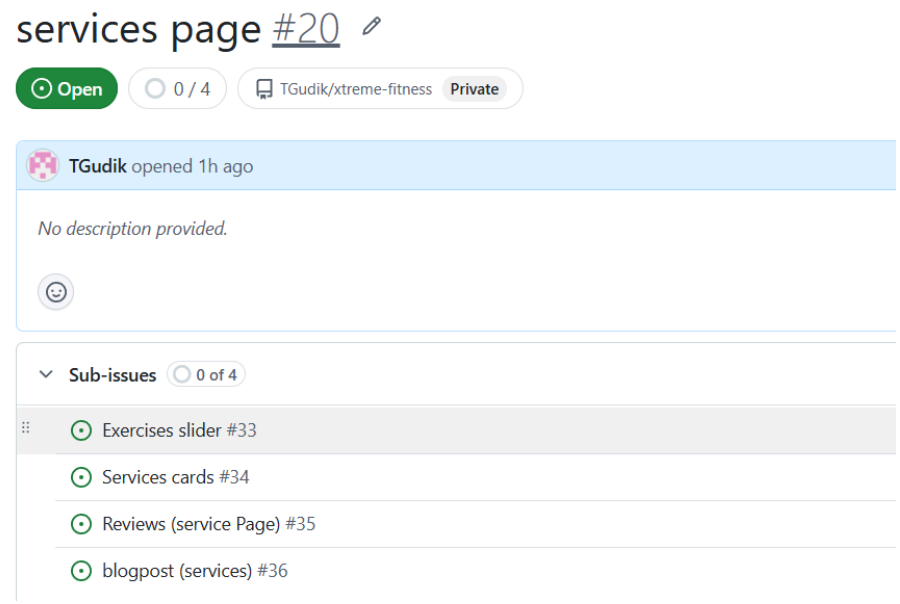


service page indeholder exercise cards i en slider, service cards, reviews i slider og seneste blogpost

Estimeret tid: 2-3 timer

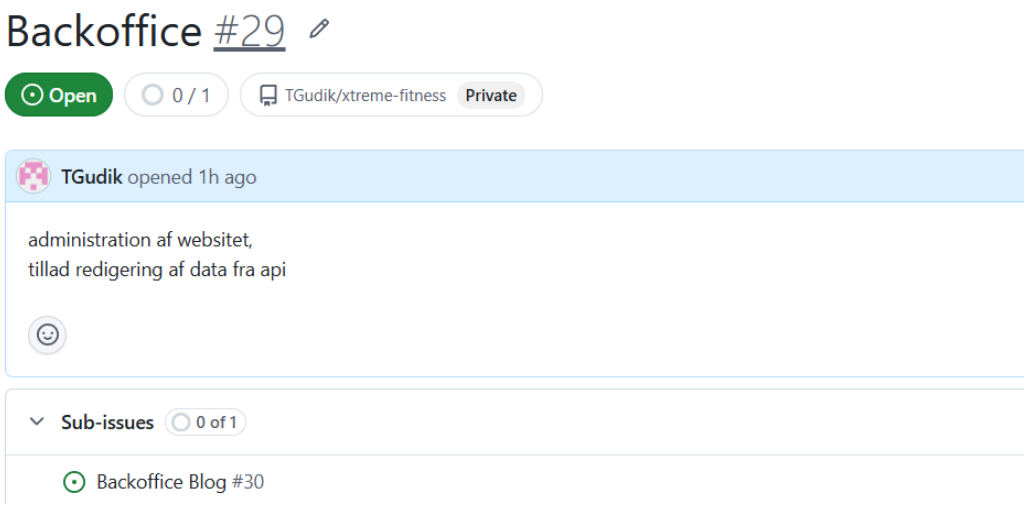


Estimeret tid: 4-5 timer

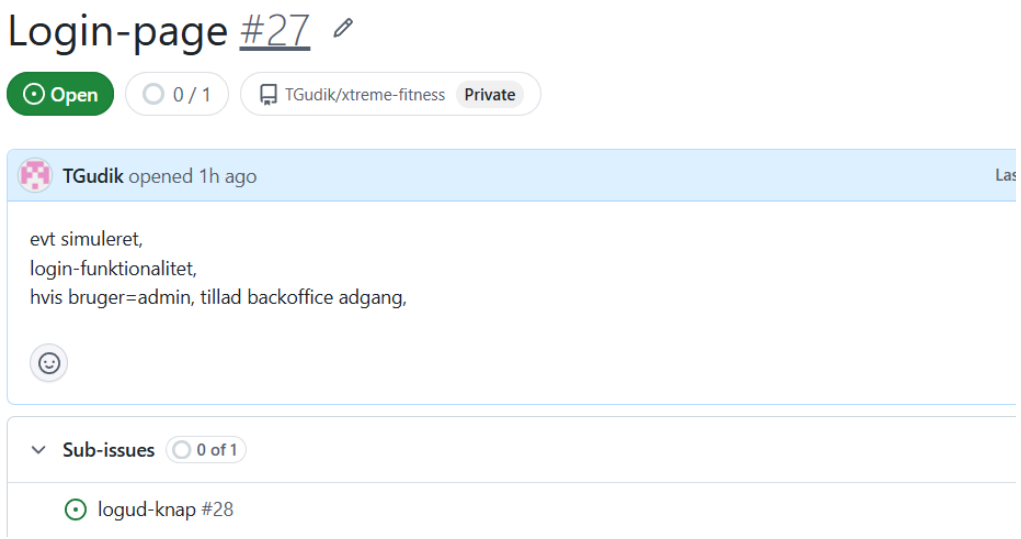


estimeret tid baseret på jeg laver reel login funktionalitet.

Estimeret tid: 3 timer

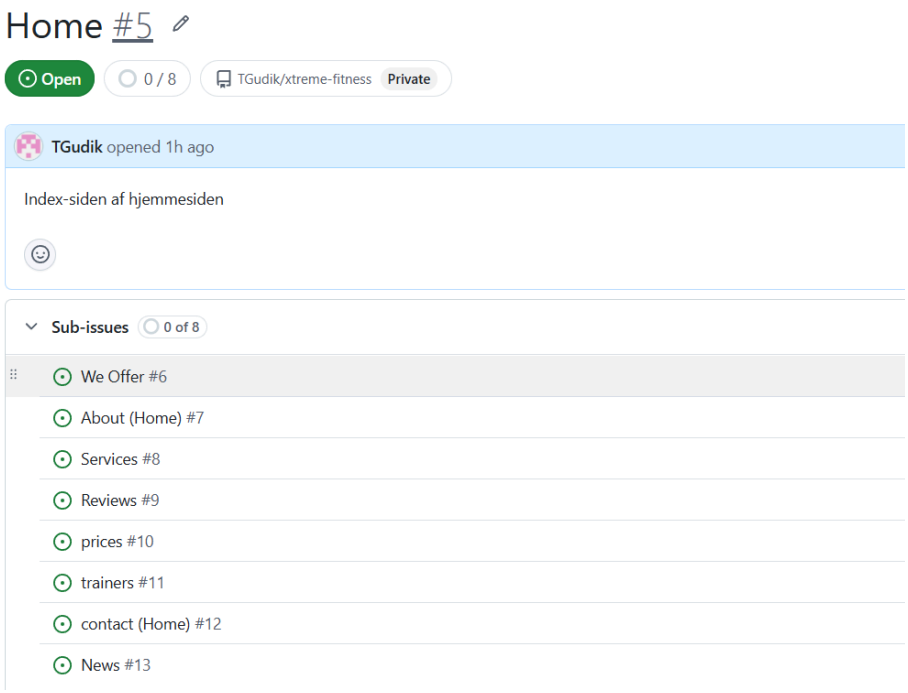

På home er det meste lavet i undersiderne, derfor er det bare primært at samle komponenterne på home til sidst

Estimeret tid: 2 timer

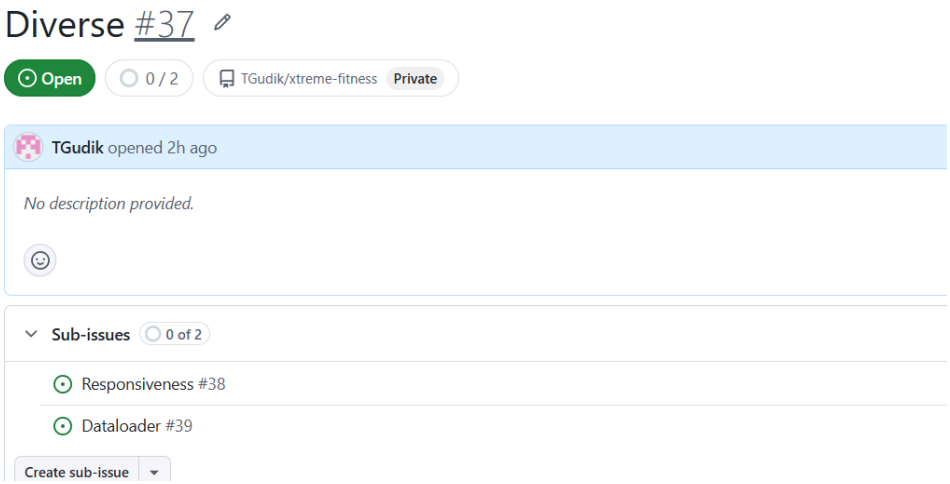

Diverse er responsiveness og dataloaderen

Estimeret tid: 4 timer

Opsummering tidsplan

Samlet estimeret tid af issues er 24-28 timer. Regner med der bliver diverse ting der skal laves som ikke er direkte relateret til issues (eksempelvis tidsplan og projektstyring). Derfor estimere jeg samlet tid bliver 30-34 timer for projektet.

Faktisk tid for hele projektet: 32 timer

Projekt oversigt per dag

Tirsdag:

Tirsdag opsætter jeg alt så jeg kan påbegynde projektet. Tidsplan oprettes, Github repository opsættes med issues og React boilerplate og opstiller rapporten. Alt er klar til at jeg onsdag kan påbegynde kodning.

Samlet arbejdstid: 4 timer


Onsdag:

Onsdag fik jeg ikke nået så meget, fik lavet noget sitewide komponenter, men havde ikke medregnet tiden det ville tage at oprette siderne og tilsvarende ruter, og derfor gik der lidt tid med det. Blev færdig med hero og opsat undersider udover login og backoffice.

samlet arbejdstid: 3 timer

Torsdag:

Torsdag fik jeg færdiggjort sitewide komponenter med footer, nav og rettelser på hero. Derefter startede jeg medarbejder siden, som indeholder træner cards, som jeg færdiggjorde. mens jeg arbejdede torsdag oprettede jeg et nyt issue "Page Intro" som er komponentet de fleste sider har lige under hero. Jeg lavede også om i mit kanban board, da jeg fandt ud af det var blevet lidt kludret, hver side var et parent issue og have subissues for hver sektion, men da siden genbruger mange komponenter, så blev der mange repeat issues, så slettede de unødvendige issues og samlede dem som et "indsæt genbruglige issues" på hver side, så boardet blev mere overskueligt

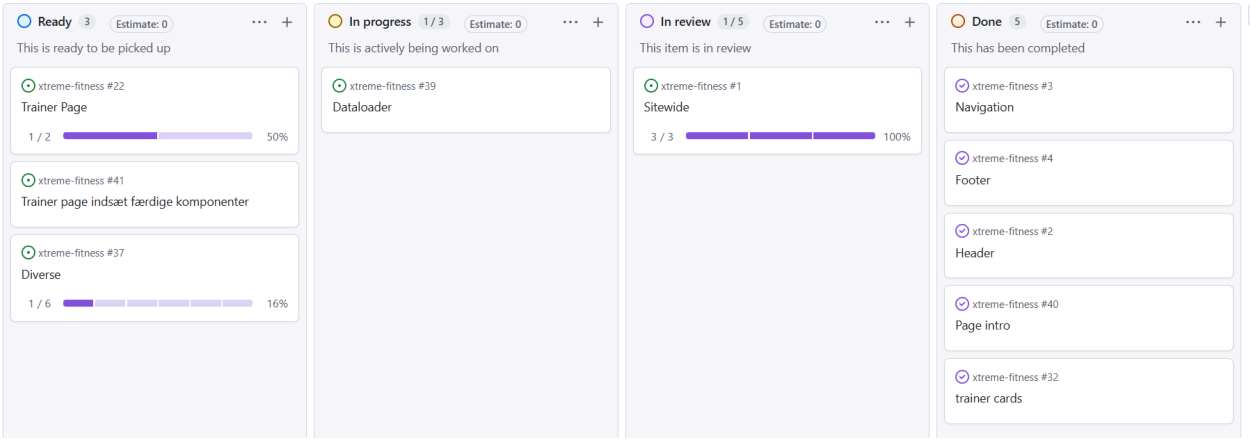

Over er kanban boardet fra afslutningen torsdag. der er flere issues i backloggen

samlet arbejdstid torsdag: 5 timer

Fredag:

Arbejdstid: 0 timer

Lørdag:

Lørdag skal jeg lidt indhente at jeg ikke fik arbejdet på projektet fredag. Jeg startede med at rette på komponenter der skulle have andre farvetemaer på andre sider end hvor jeg først byggede dem. Derefter byggede jeg Exercises- og Servicescards komponenterne og fik dem sat ind på relevante sider.

Samlet arbejdstid: 6 timer

Søndag:

Søndag færdiggøre jeg først reviewkomponent, efter blogindlæg med blogPage og til sidst aboutSection. Det betyder det eneste komponent til bruger-siderne der mangler er kontakt-formen. Derfor er siderne Services og subscriptions færdig, og resten mangler kun kontaktformularen. Mandag færdiggøre jeg kontakt og derefter er jeg klar til backoffice og login-funktionalitet. Desuden er Dataloader færdig, da jeg ikke har noget med kontaktformularen på den fil

Samlet arbejdstid: 5 timer

Mandag:

Mandag skulle jeg færdiggøre med loginfunktion og backoffice. Det endte med at tage noget længere tid end jeg regnede med, men nåede i mål med alle funktionaliteter og ekstraopgaven med en reel loginfunktion. Det jeg ikke nåede var responsivitet og 404-side

Samlet arbejdsTid: 9 timer

Tech stack

Frameworket jeg arbejder i er React, det er det framework jeg har mest erfaring med fra både skole og selvstændige projekter. React gør så man kan bygge sider op i genbrugelige komponenter, som i stor del er til nytte i dette projekt, som bruger mange af de samme sektioner på flere sider. Derfor er React oplagt.

Til styling har jeg valgt at benytte React CSS Modules, da det er den form for CSS jeg bedst kender, og foretrækker at style mine komponenter i en fil, som modul-CSS tillader.

Jeg har brugt react-router-dom til at opdele og vise de rigtige sider til de korresponderende paths.

React-bootstrap-icons brugte jeg til some-ikoner i footeren

React-hamburger brugte jeg til hamburger i nav

Faglige valg og dokumentation

jeg har valgt at lave mapperne loaders, utils, hooks og context
loaders er til mine ruter, og det data de kan tilgå ved at være på stien.

hooks er custom react hooks jeg bruger i backoffice til opdatering af data i api

utils er til at holde funktionerne jeg skal bruge i min context på siden

Tilvalgsopgaver

Login funktionalitet:

login-forespørgsel til api-rute /auth/signin. Den returnerede token gemmes i localStorage og autenticeres på ruten /auth/token. Problemet i mit login-flow er at jeg har glemt at ændre .env filen i backend til at USE_JWT = TRUE, derfor kan ikkeautenticerede brugere stadig tilgå de ruter og metoder de ikke skal. De kan ikke tilgå selve backoffice siden, men backenden er ikke sat op til at udelukke forespørgelser der ikke er admin-verificerede og mine api-kald indeholder ikke en token i forespørgslen, som ville gøre at api'en ville acceptere dem hvis usejwt var sat til.

Angivelse af tredjepart og AI

Baggrunds-gradienten som i figma hedder 'our-services-background' indeholder to farver i en diagonal gradient. Jeg bedte AI lave en matchende CSS linear gradient, som jeg kunne anvende de relevante steder.

Testoplysninger

- https://github.com/TGudik/xtreme-fitness
- admin@mediacollege.dk, password: admin
